


FASE 11 - COMPLETAMENTO OPERE IN C.A. DELLA CABINA TECNICA

11 SEZIONE (FASE 11)
SCALA 1:200

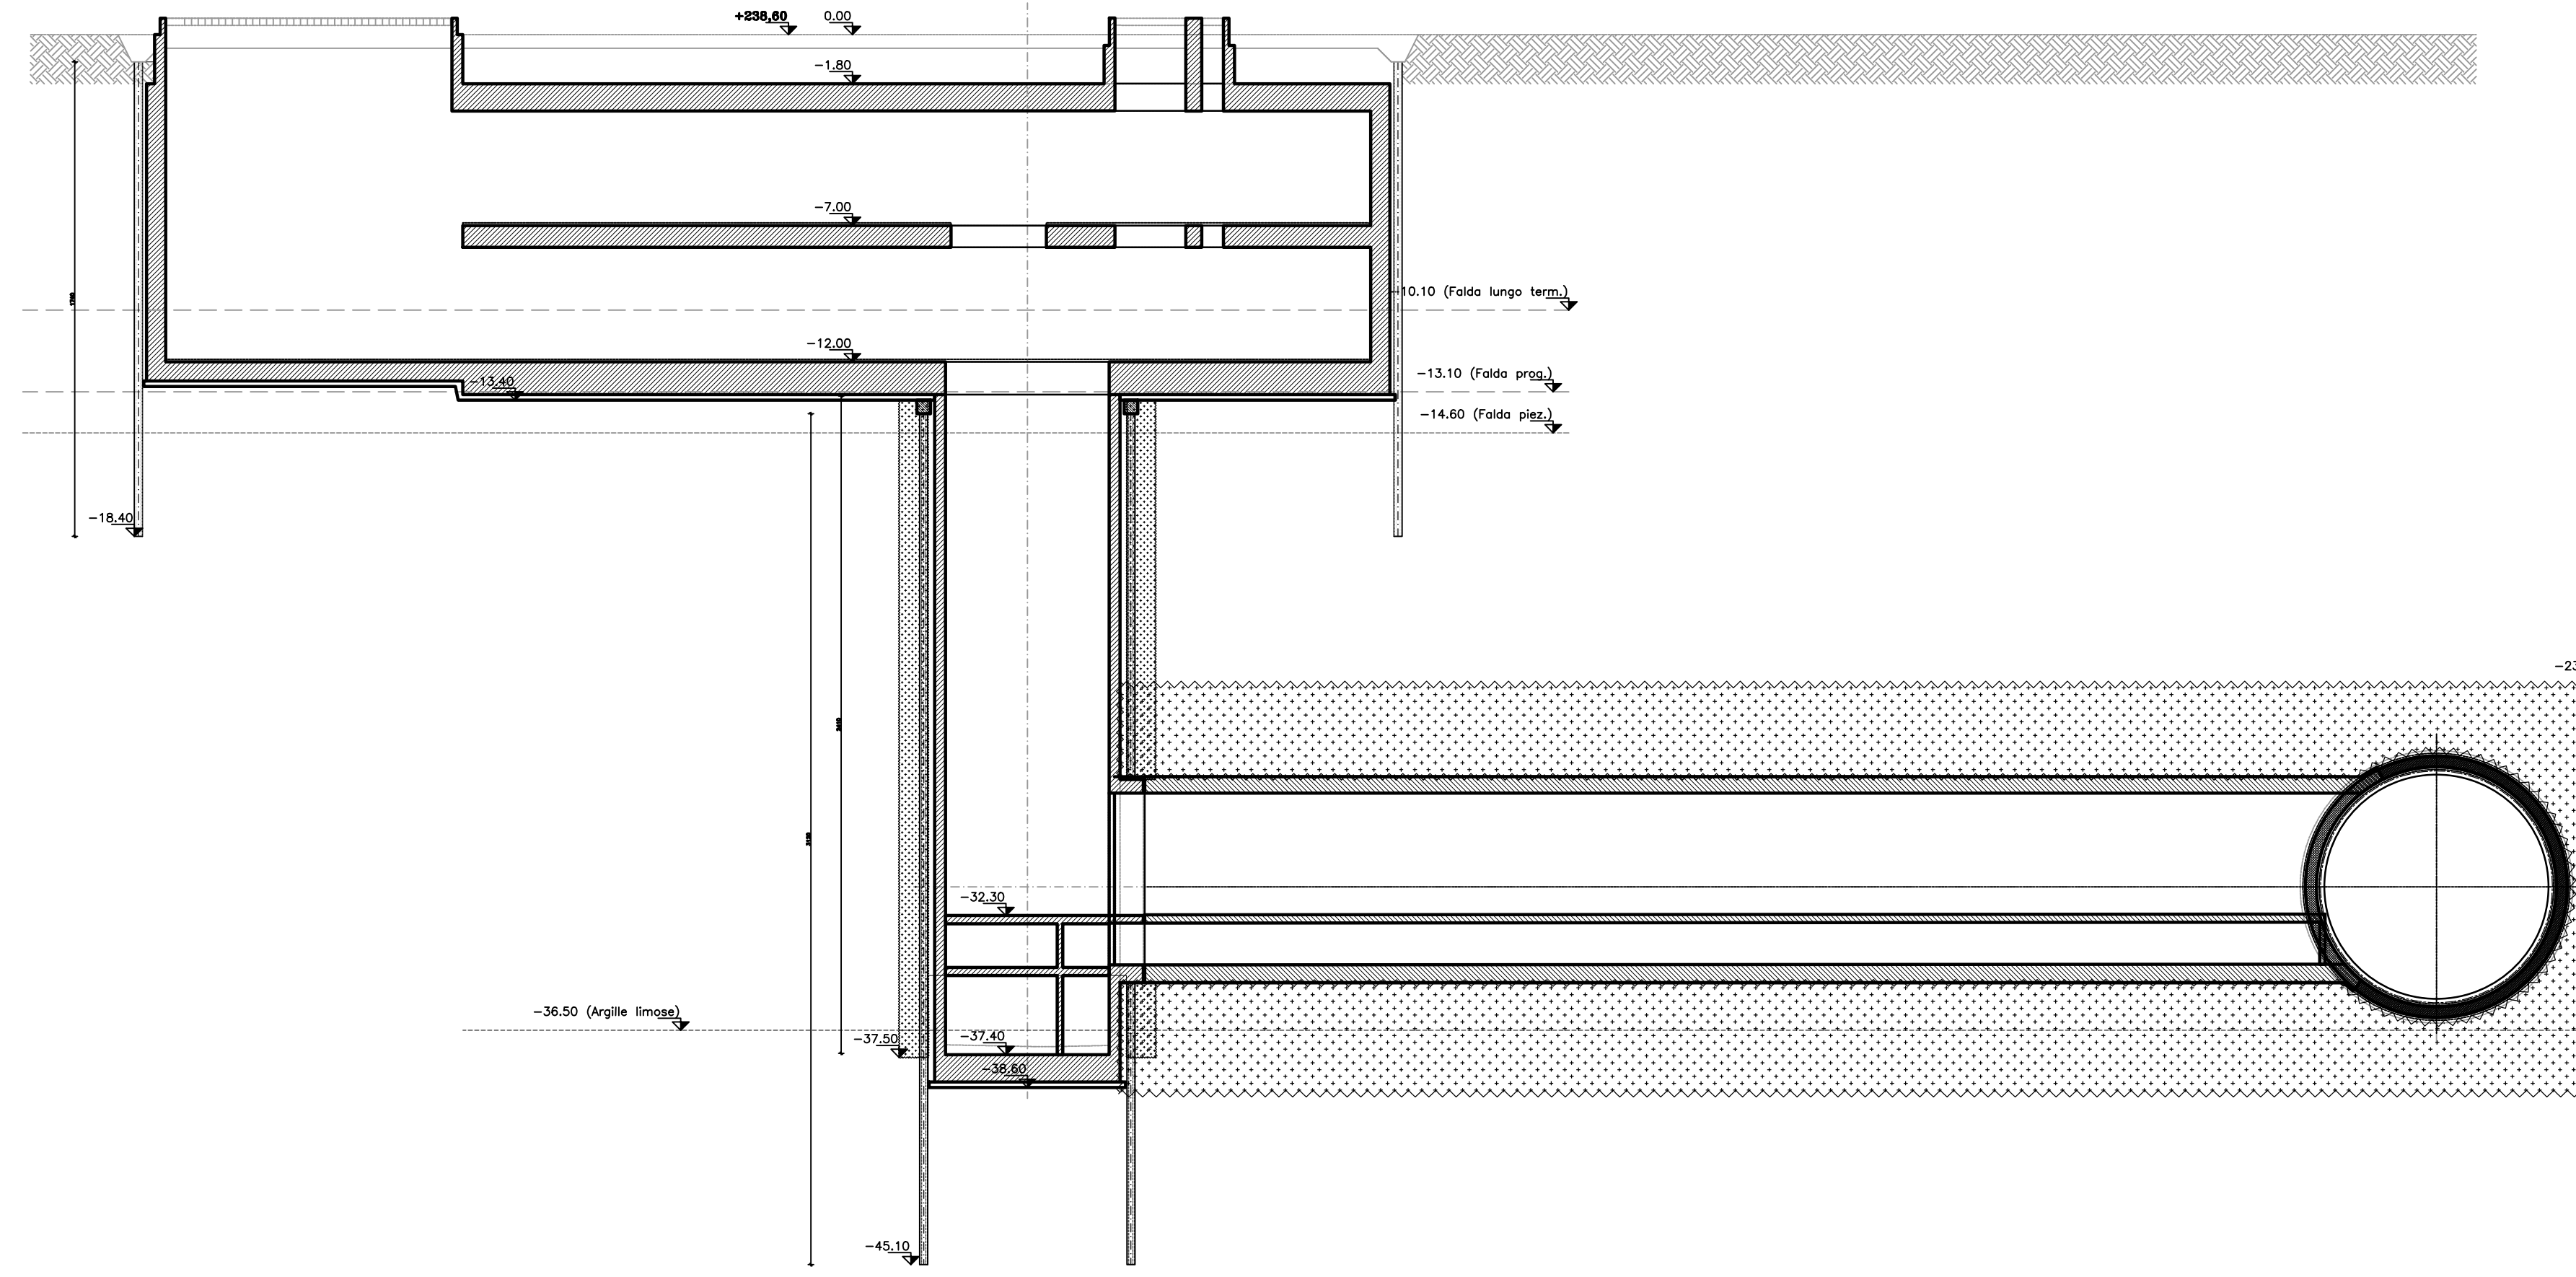


FASE 11 - SVILUPPO ESECUTIVO

- POSA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLE PARETI DELLA CABINA TECNICA FINO AL 3 LIVELLO DI SISTEMA DI CONTRASTO
- RIMOZIONE DEI PUNTONI PROVVISORI DEL 3 LIVELLO E GETTO DELLE PARETI DI RIVESTIMENTO E SOLETTA INTERMEDIA DELLA CABINA TECNICA LASCIANDO I FERRI DI RIPRESA PER LE STRUTTURE SUPERIORI
- AD AVVENUTA MATURAZIONE DELLA SOLETTA INTERMEDIA, RIMOZIONE DEI PUNTONI PROVVISORI DEL 2 LIVELLO E GETTO DELLE PARETI DI RIVESTIMENTO E SOLETTA DI COPERTURA DELLA CABINA TECNICA
- AD AVVENUTA MATURAZIONE DELLA SOLETTA DI COPERTURA RIMOZIONE DEI PUNTONI PROVVISORI DEL 1 LIVELLO
- DEMOLIZIONE CORDOLI TESTA MICROPALI
- POSA MURETTO DI SOSTEGNO DEL TERRENO AL DI SOPRA DELLA SOLETTA DI COPERTURA
- POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DEI RELATIVI MASSETTI DI PROTEZIONE ALL'ESTRADOSSO DELLA SOLETTA

FASE 12 - RIPRISTINO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E SOTTOSERVIZI

12 SEZIONE (FASE 12)
SCALA 1:200

SEZIONE 1-1

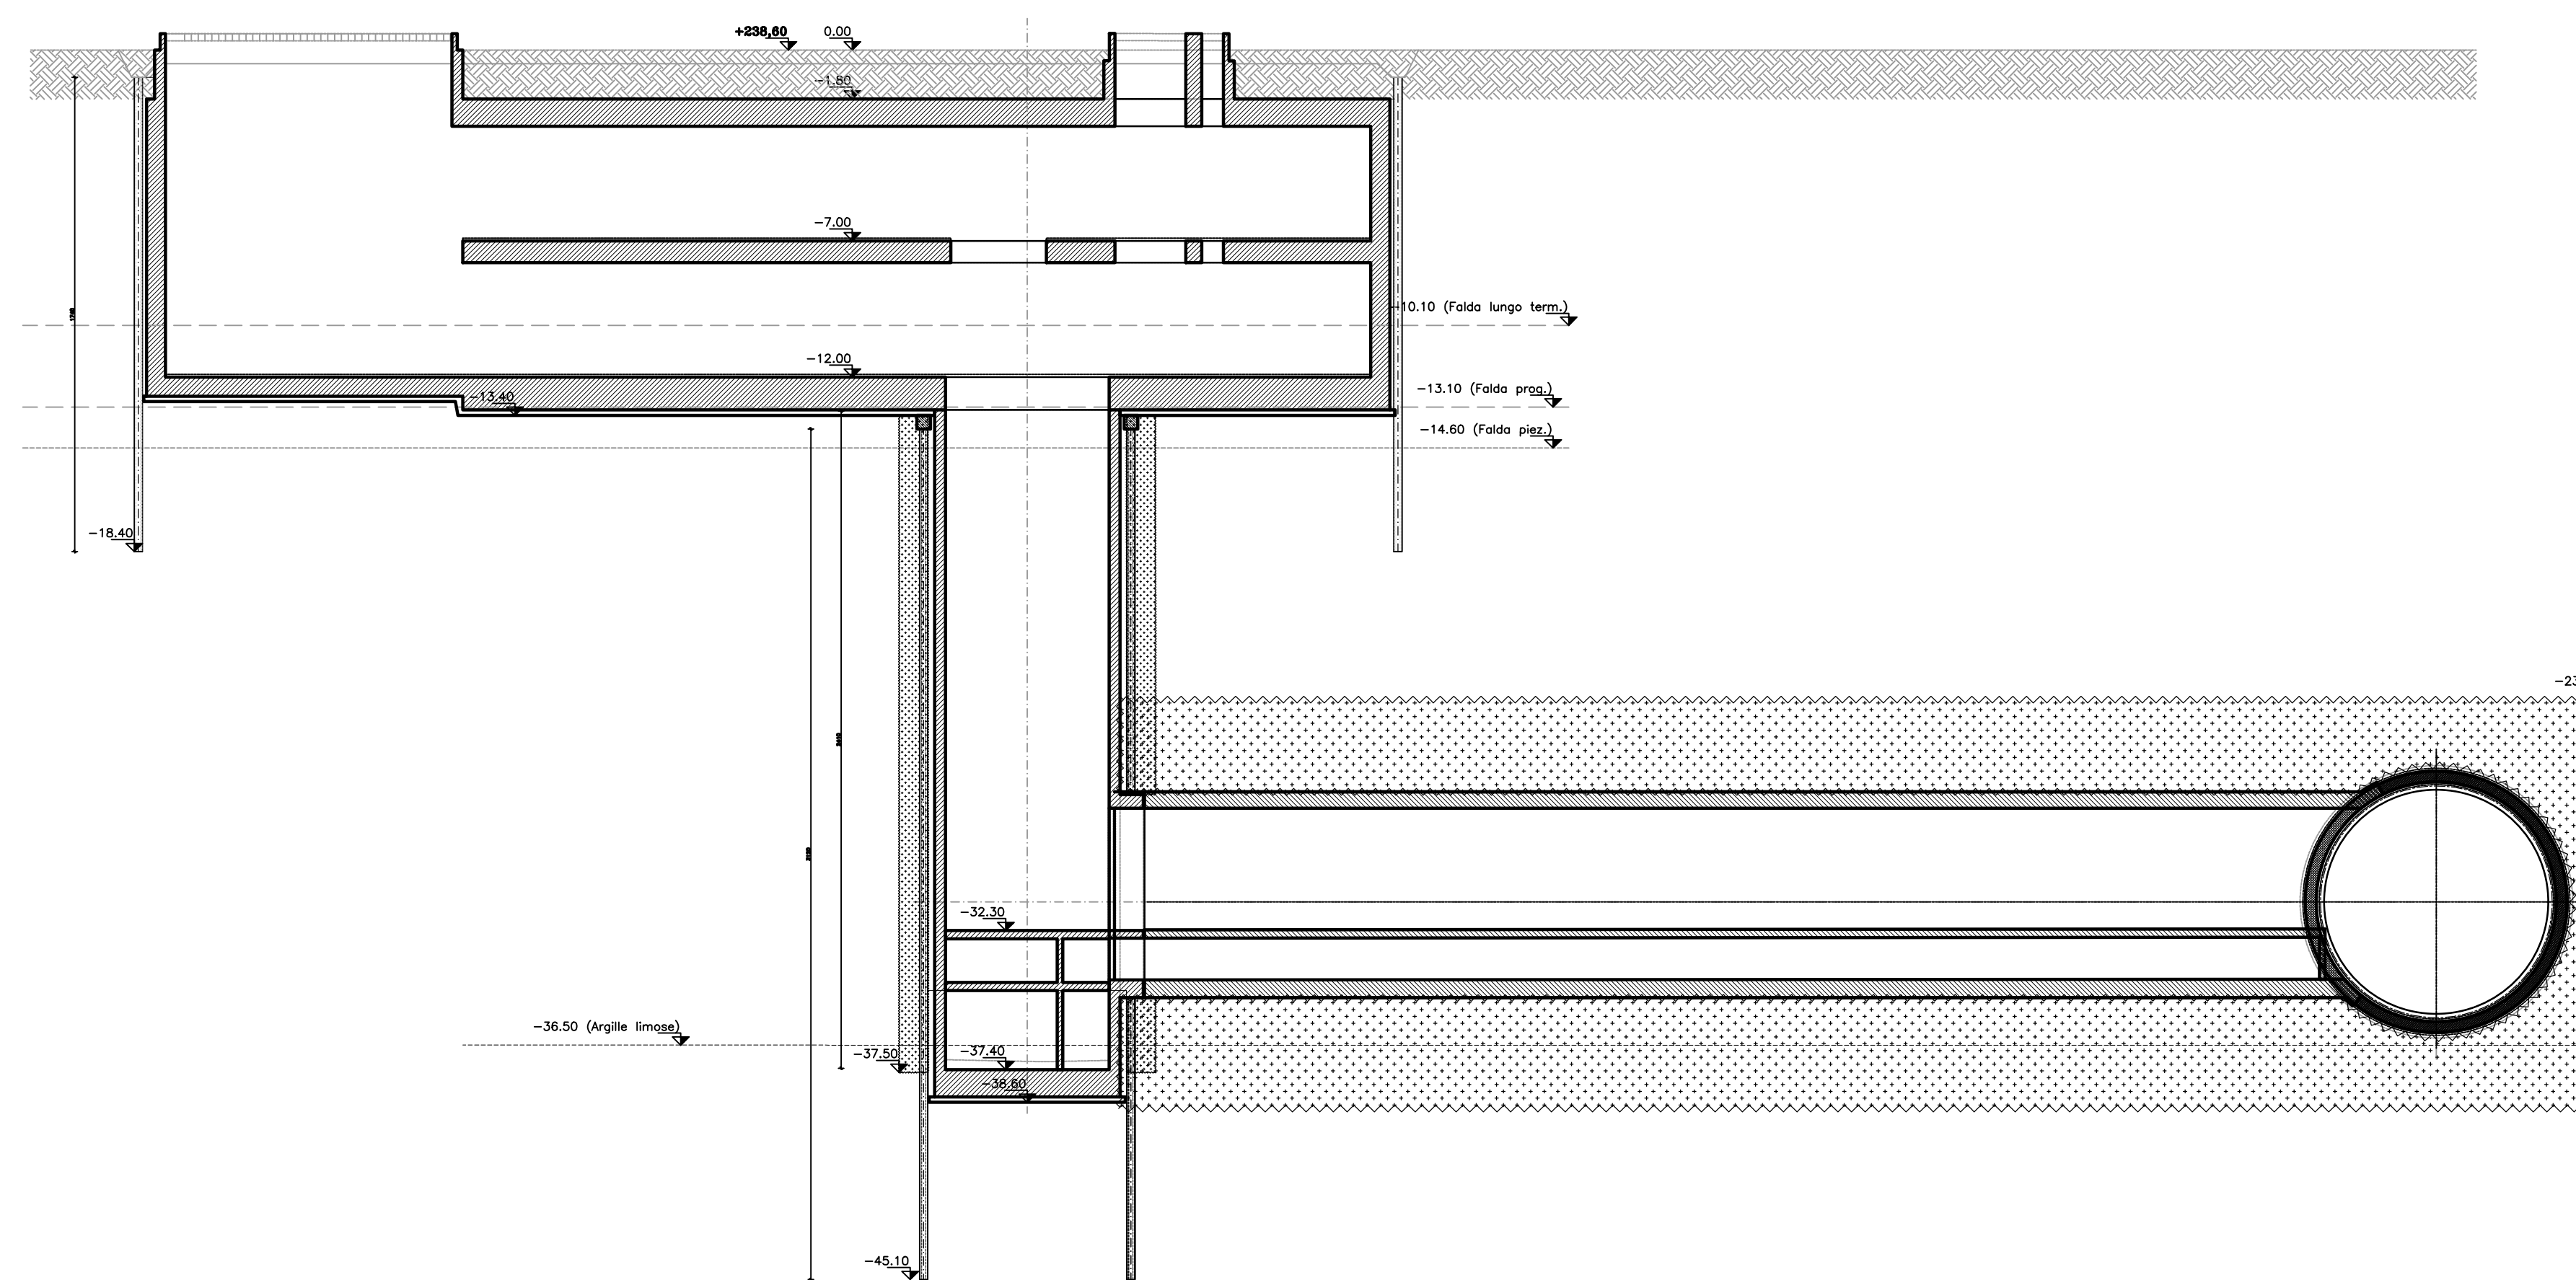

FASE 12 - SVILUPPO ESECUTIVO

- EVENTUALE RIPRISTINO SOTTOSERVIZI
- RINTERRO FINO ALLA QUOTA DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE PREVISTA IN PROGETTO
- POSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE PREVISTA IN PROGETTO E DEGLI ARREDI E RIPRISTINO VIABILITA'

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE



COMUNE DI TORINO



METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO		INFRATO INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ		INFRASTRAPORTI.TO S.r.l.	
DIRETTORE PROGETTAZIONE Responsabile integrazione disciplina specialistiche		IL PROGETTISTA			
Ing. R. Crova Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 60385		PROGETTO STRUTTURALE - POZZI E MANUFATTI DI LINEA POZZO DI INTERTRATTA PASTRENGO SCHEMA FASI COSTRUTTIVE - TAV 4 DI 4			
ELABORATO		REV.	SCALA	DATA	
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi		MTL2T1A2ISTR PPA T 004	0 2	1:200	06/10/2023

AGGIORNAMENTI						
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	18/01/22	LFA	PGM	FRI	RCR
1	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	25/11/22	LFA	PGM	FRI	RCR
2	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	06/10/23	PGM	PGM	FRI	RCR
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

LOTTO 2	CARTELLA	8.4.12	7	MTL2T1A2D	STRPPAT004
STAZIONE APPALTANTE					
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Ing. R. Bertasio					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Strozziro					
