



ACCORDO DI PROGRAMMA INCUBATORE DI IMPRESE DI BIOTECNOLOGIE

ENERGIA SOLE PRODUZIONE ELETTRICA SCHEMATA SOLARE LUCE CONTROLLATA
LUCE ZENITALE




COMMITTENTE



Via Cavour 31 - 10121 Torino

RAGGRUPPAMENTO DI PROGETTO

Mandataria



Ai Engineering S.r.l.
Via A. Lamarmora 80
10128 Torino

P. IVA n. 06764910011
C.F. 01066850064

Tel.: 011.58.14.511
Fax: 011.56.83.482
E-mail: posta@aiengineering.it
Web: www.aiengineering.it

Mandanti



Ai STUDIO
Via A. Lamarmora 80
10128 Torino
P. IVA / C.F. 04348600018

P. IVA / C.F. 04348600018



DUO' dott. geol. Emmanuele

via Principe Amedeo n. 79, Agliè (TO)
P.IVA n. 09990470016.
tel. 340.3351073, e-mail: emmanueleduo@gmail.com

Responsabile del procedimento


Prof. Lorenzo Silengo

Design leader

Prof. ing. Attilio Bastianini

Progetto architettonico

arch. Hermann Kohlhaas
ing. Marco Serini
con arch. Alessandro Rigazio

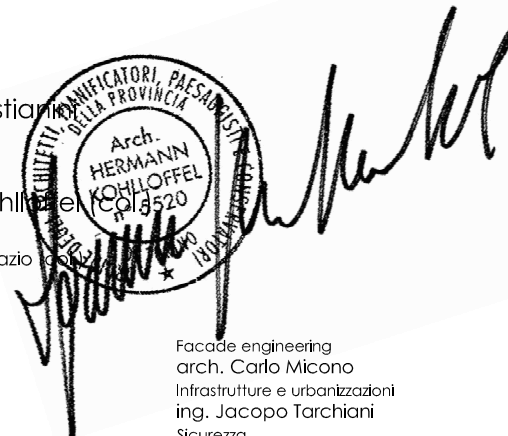

Aree specialistiche

Strutture
ing. Giorgio Piccarreta
Impianti
ing. Stefano Crema
arch. Pier Paolo Valle
Strategie energetiche
ing. Enzo Bestazzi
Ambiente, geologia, TRS
geol. Emmanuele Duò
Antincendio
ing. Filippo Così

Facade engineering
arch. Carlo Micono
Infrastrutture e urbanizzazioni
ing. Jacopo Tarchiani
Sicurezza
ing. Sabrina Bello
Acustica
arch. Vincenzo Bonardo (col.)
ing. Rosamaria Miragliano
Giovane architetto
arch. Arianna Chiara

Project control

ing. Marco Serini
con arch. Eugenio Bastianini
con ing. Enzo Stanziani

TIPOLOGIA ELABORATO:

PROGETTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

DATA CONSEGNA:

OTTOBRE 2013

SCALA:

/

FORMATO:

A4

ID COMMESSA:

13 M 010

REVISIONE:

DATA (aammgg):

OGGETTO EMISSIONE / REVISIONE:

CODICE TAVOLA / NOME FILE:

N° PROGR:

a

131025

PRIMA EMISSIONE PER PDC

b

131106

AGGIORNAMENTO

G05mCcrp01b

G05

TORINO BIOTECNOLOGIE INCUBATORE (TBI) - CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'																																	
ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine																												
						2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024							
1	1	Ipotesi conclusione Accordo di Programma	0 g	ven 15/11/13	ven 15/11/13																												
2	2	Validità accordo di programma	3650 gt	ven 15/11/13	lun 13/11/23																												
3	3	LAVORI DI DEMOLIZIONE (e attività correlate)	120 gt	lun 03/02/14	mar 03/06/14																												
4	4	LAVORI REALIZZAZIONE INCUBATORE	2420 g	gio 03/07/14	mer 11/10/23																												
5	4.1	INCUBATORE (Primo Stralcio)	540 gt	gio 03/07/14	ven 25/12/15																												
6	4.2	INCUBATORE (completamento)	2820 gt	gio 21/01/16	mer 11/10/23																												
7	5	LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' SUD	150 g	ven 12/12/14	ven 10/07/15																												
8	5.1	POSA SOTTOSERVIZI	60 g	ven 12/12/14	ven 06/03/15																												
9	5.2	REALIZZAZIONE STRADA ED OPERE ESTERNE	90 g	ven 06/03/15	ven 10/07/15																												
10	6	LAVORI REALIZZAZIONE PRIMO STRALCIO VIABILITA' OVEST	100 g	ven 20/02/15	ven 10/07/15																												
11	6.1	POSA SOTTOSERVIZI	40 g	ven 20/02/15	ven 17/04/15																												
12	6.2	REALIZZAZIONE STRADA ED OPERE ESTERNE	60 g	ven 17/04/15	ven 10/07/15																												
13	7	COLLAUDI VIABILITA' INTERESSATE DAL PRIMO STRALCIO	60 g	ven 10/07/15	gio 01/10/15																												
14	8	IPOTESI di Stipula della convenzione relativa alla restante parte dello "Scalo Vallino"	0 g	lun 13/06/16	lun 13/06/16																												
15	9	LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA' OVEST	90 g	mar 29/11/16	mar 04/04/17																												
18	10	COLLAUDI VIABILITA' PARTE RESTANTE	50 g	mar 04/04/17	mar 13/06/17																												

NOTA 1: Non sono prevedibili i tempi di attuazione dell'intervento sulla restante parte dello "Scalo Valino" in quanto dipendenti da:
